

東カウンターホール作業状況 およびスケジュール

坂中章悟


第38回ERL検討会, 2009年12月9日

東カウンターホール塗り床工程

2009.11.20 打合せ


- Aエリア(冷凍機用) → 完了
- 外周エリア → 年内に完了
- 中央エリア → 1月20日~2月末

(一部のみに年内に完了)

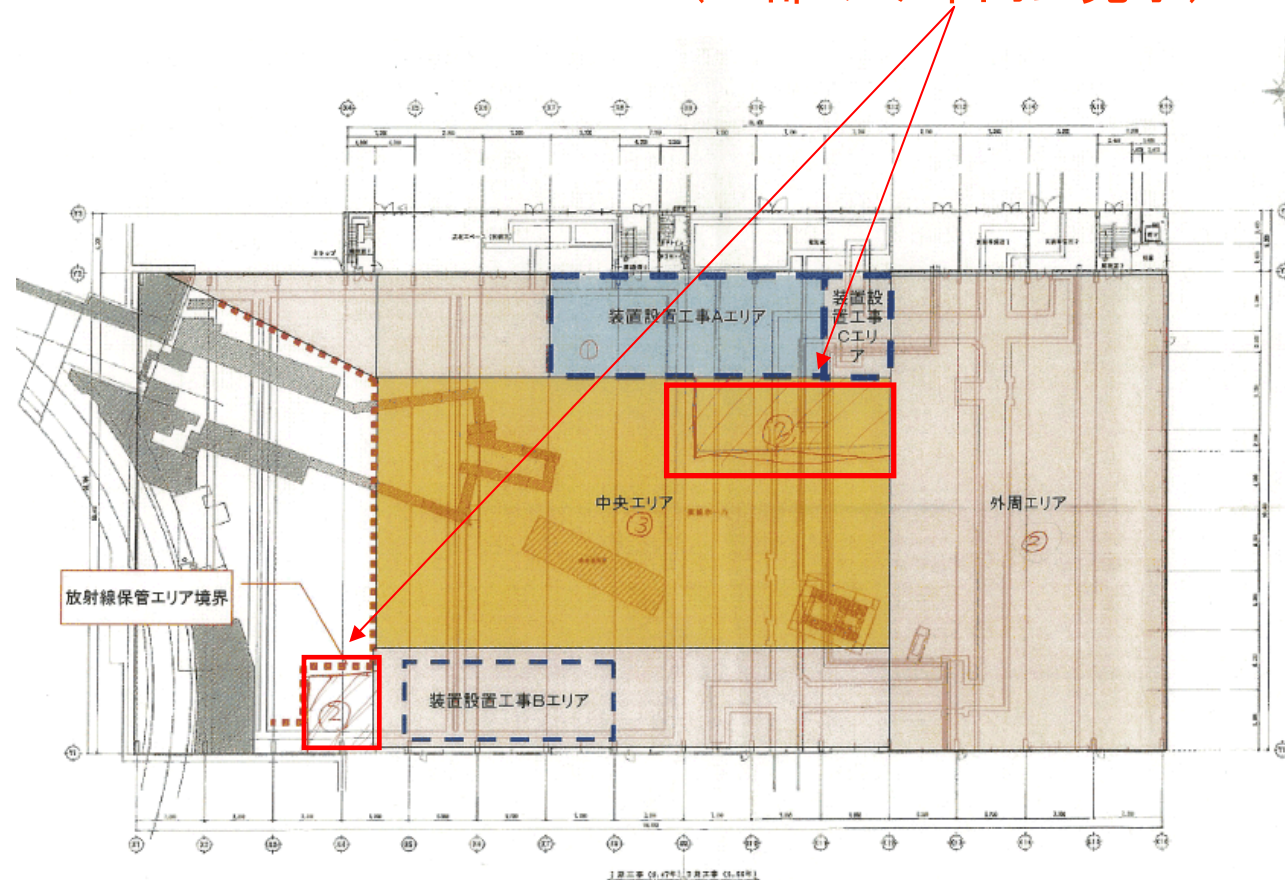

外構工事日程

- 3月1日～3月10日：搬入が全くできない（東側舗装工事）
- 2月10日～3月10日：南側シャッターからの搬入不可（南側舗装工事）
- 2月1日～2月26日：北側は車通行止め（北側舗装等工事）

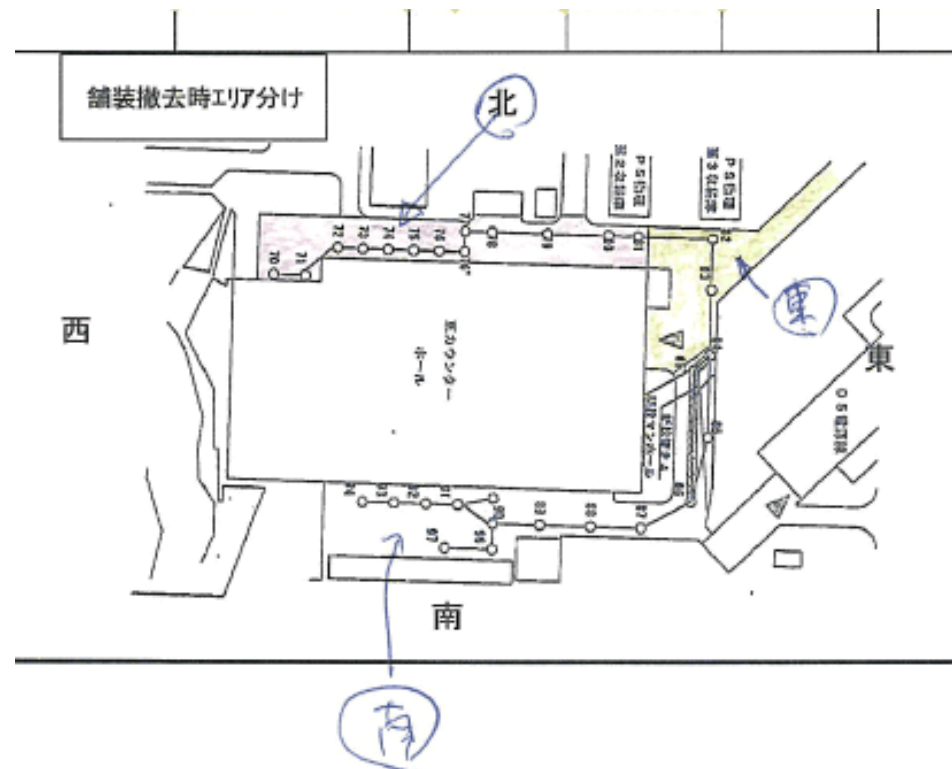

クレーン予定、電気

クレーン作業

- クレーンは1月初めから使用可能
- 1月：素核研の片付け優先
ERLで使いたい場合、素核研の家入さんに予約
- 2月以降：クレーンはERL優先
素核研の作業もあるので、ERL側で調整者を出す

電気

- 冷凍機、クリーンルームの設置作業用の仮電源を設置した
- 仮電源から実験盤への切り替え時に、1～2日停電する
(1月下旬～2月上旬)
- すべての実験盤は3月5日以降に使用可能の予定

アナウンス

- 搬入不可の期間に注意
- クレーンの競合の調整が必要
- 他のグループに仕事を依頼する時は、早めの連絡を
- 打合せで他のグループと相談しましょう
 - cERL建設打合せ(3週間に一度)
 - ERL検討会(月に一度)
 - 東カウンターホール改修定例会(毎週月曜日14:00 ~)
 - 施設部と建設業者の打合せ
 - その他、必要に応じて打合せを開きます。

東カウンターホール写真(1)



東カウンターホール写真(2)

